



Wymurówka pieca obrotowego nr 4 w roku 2021


Planowany stan wymurówki przed remontem 2021r

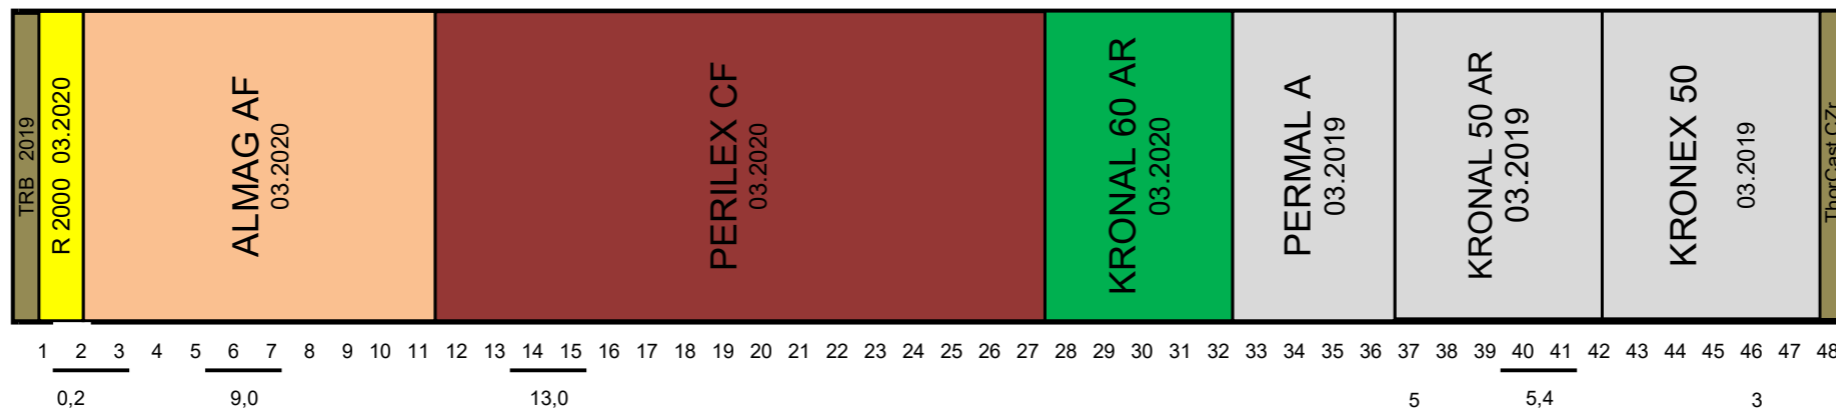

PLAN NA REMONT



Zrealizowana cegła w remoncie 2021

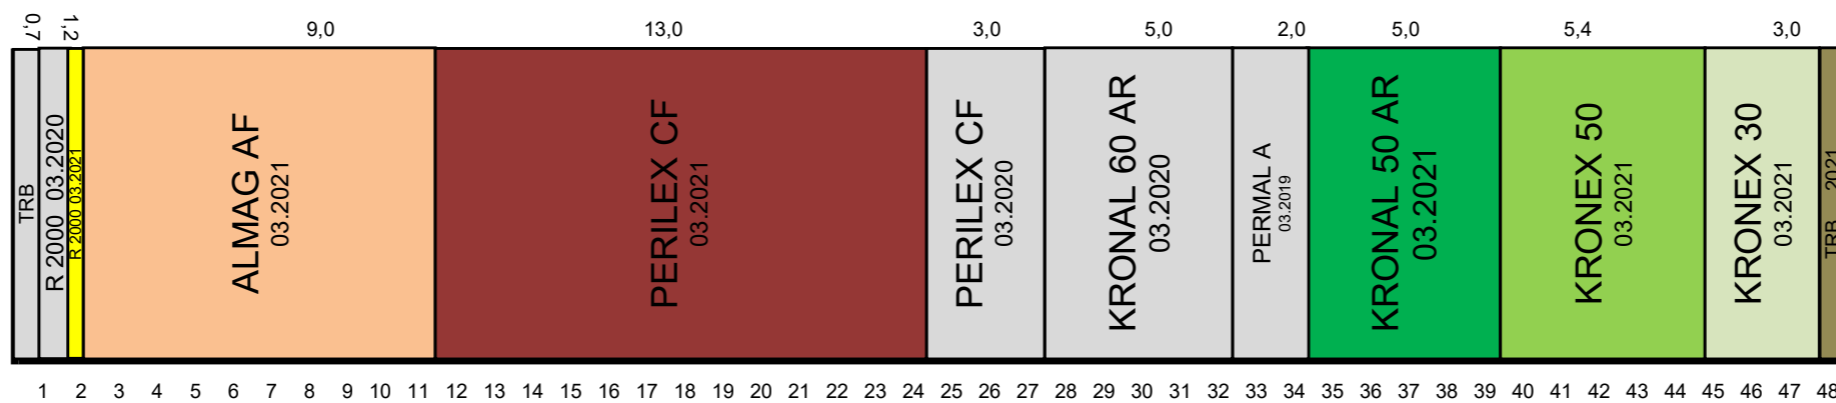

ZAMÓWIENIE CEGŁY

na magazynie



Stan wymurówki na dzień 18.09.2020

19,0	20,0	16,0	16,5	15,0	13,5	13,0	17,5	18,0	19,0	13,5	16,5	14,0	17,5	16,5	17,0	15,5	18,0	16,0	17,0	17,5	18,0	18,5	17,5	19,0	20,0	16,5	18,5	19,0	19,5	19,5	17,5	19,0	19,5	20,0	11,0	20,0	11,0	11,0	11,0	11,5	9,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0
222/622																								220/620																												
20,0	19,5	18,0	16,0	13,5	14,5	15,0	18,0	18,0	19,0	14,0	17,0	15,0	17,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,0	18,5	17,0	19,5	20,0	16,5	18,5	19,0	19,5	20,0	17,0	19,5	20,0	11,0	11,0	11,5	11,5	9,0	10,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48					

metry w piecu

Układanie cegły

Wymurówka pieca obrotowego nr 4 w roku 2021

Gatunek cegły	ilość cegieł na pierścień					ilość mb w piecu [m]	ilość pierścieni [szt.]	uwagi
	FORMAT	[szt.]	FORMAT	[szt.]	stos.			
R 2000	322	77	622	27	3 : 1		0	Cegłę, niezależnie od rodzaju, <u>układamy z przesunięciem pierścieni względem siebie o połowę szerokości cegły</u>
ALMAG AF	B222	85	B622	54	2 : 1		0	
PERILEX CF	B222	85	B622	54	2 : 1		0	
KRONAL 60 AR	B220	39	B620	65	1 : 2		0	
