

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

tel. 77 44 35 191

ryszard.gwozdek@psgaz.pl

Biuro Usług Technicznych

„DROGTOM”

ul. Jesionowa 15/8

45-409 Opole

Wasz znak:

Opole, 16.10.2023

Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.464.23

Dot.: przebudowy drogi gminnej ul. Szkolna w Łambinowicach

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na terenie objętym przedmiotową inwestycją przebiega czynna sieć gazowa średniego ciśnienia wykonana z rur polietylenowych DZ 90/40/32 wybudowana w latach 2017-2019. Głębokość posadowienia 0.75-1.7m. Niniejszym pismem uzgadniamy projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Szkolna w Łambinowicach. Z uwagi na prace drogowe jakie będą wykonywane w strefie kontrolowanej sieci gazowej oraz zbliżenia do sieci gazowej podajemy warunki jakie należy uwzględnić przy wykonywaniu projektu budowlano-wykonawczego i późniejszej realizacji rozbudowy ul. Szkolnej w Łambinowicach:

- przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne pod nadzorem Służb Technicznych Gazowni w Nysie w miejscach kolizyjnych celem dokładnego zlokalizowania istniejącej sieci gazowej,
- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),
- w przypadku nie zachowania normatywnych odległości od górnej nawierzchni projektowanej drogi i normatywnych odległości infrastruktury drogowej do sieci gazowej, należy zabezpieczyć sieć gazową. Sposób zabezpieczenia sieci

gazowych należy uzgodnić ze Służbami Technicznymi Gazowni w Nysie. W przypadku braku możliwości wykonania zabezpieczenia sieci gazowej należy dokonać przebudowy odcinka kolidującego z przedmiotową rozbudową,

- w przypadku konieczności wykonania przebudowy należy wystąpić do Działu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w OZG w Opolu z wnioskiem o wydanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej,
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod płatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nysie,
- ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstałe w trakcie prowadzenia robót usuwane będą staraniem i na koszt Inwestora,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Nysie na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- zakres rzeczowy ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowej (obniżenie, złożenie rur ochronnych lokalizacja i usytuowanie istniejących skrzynek armatury sieci gazowej itp.) należy uzgodnić ze Służbami Technicznymi Gazowni w Nysie oraz należy zlecić do wykonania firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia,
- wykonanie zabezpieczenia odcinków sieci gazowej nie może się wiązać się z przerwą w dostawie gazu do odbiorców. Ewentualne koszty związane z zagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorców spowodowane wykonaniem zabezpieczenia odcinków istniejącej sieci ponosi Inwestor,

Czynną sieć dystrybucyjną średniego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych.


Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Nysie
3. ZMDZ a/a

Z poważaniem
KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Broniec

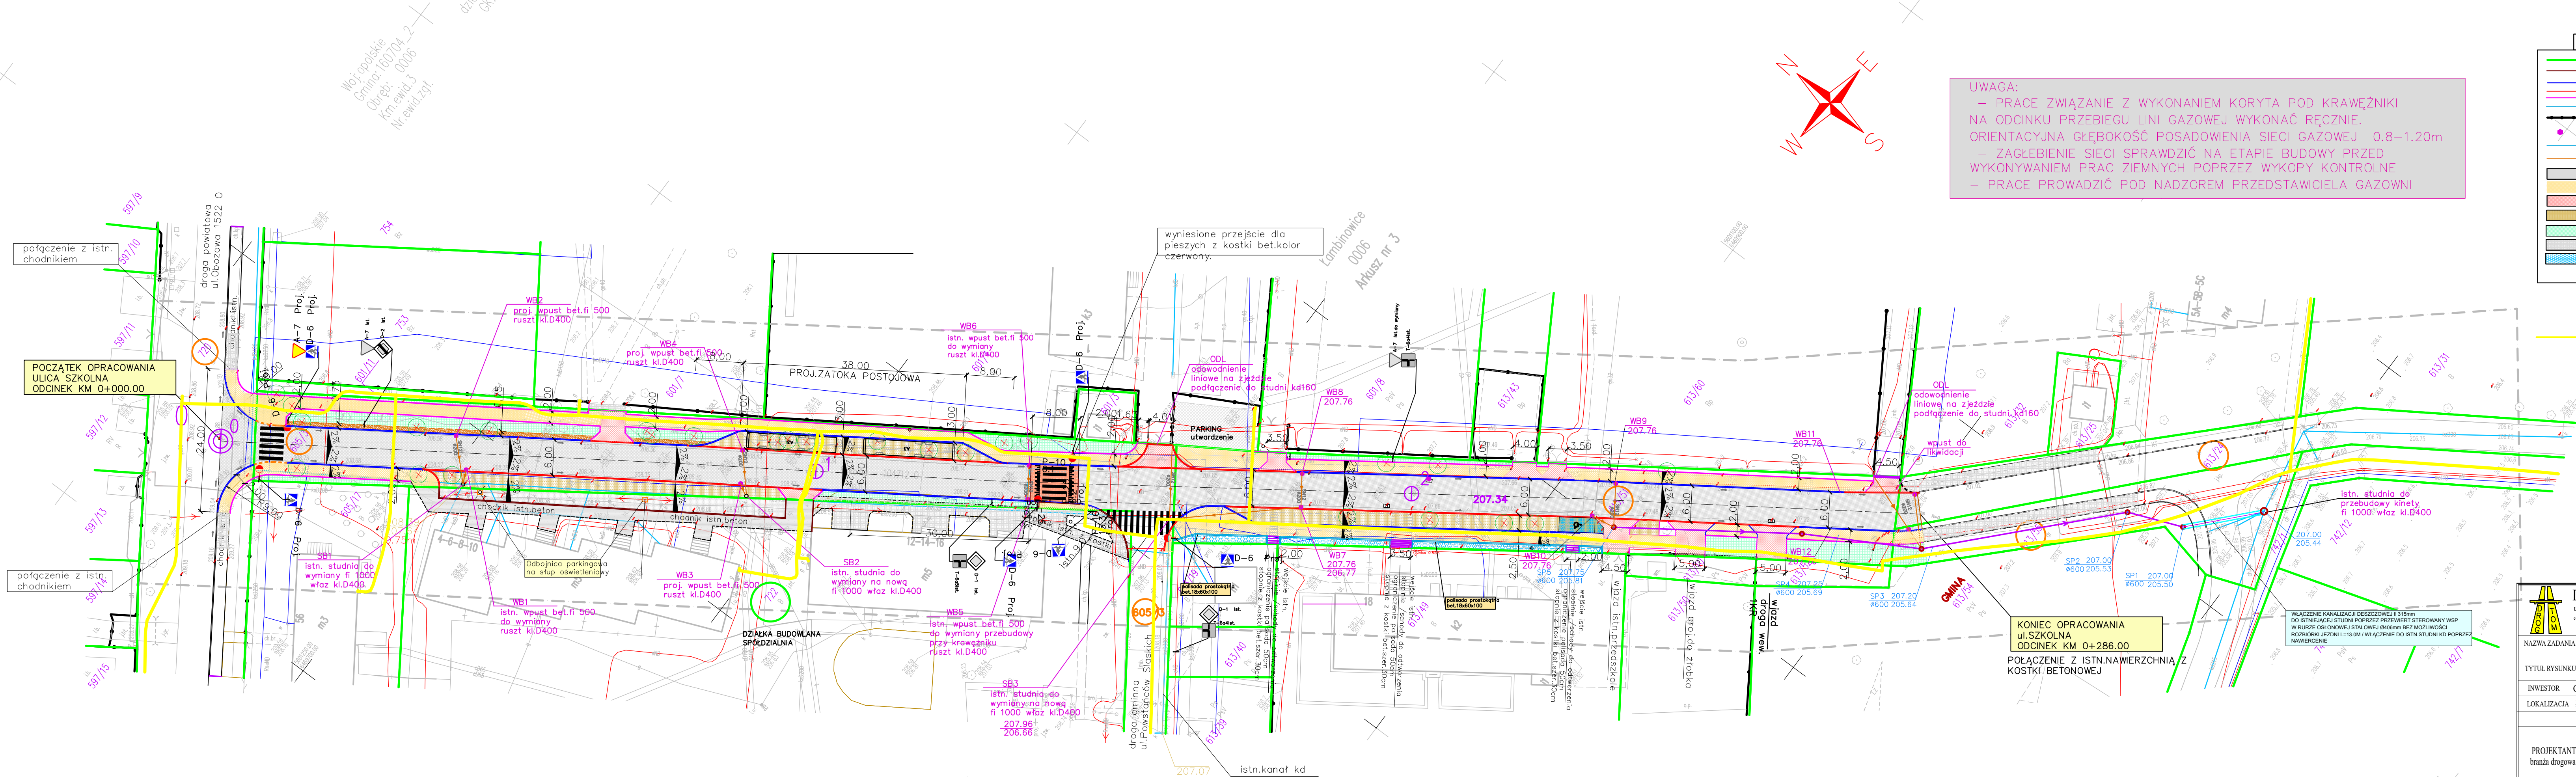

UWAGA:
- PRACE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KORYTA POD KRAWĘŻNIKI
NA ODCINKU PRZEBIEGU LINI GAZOWEJ WYKONAĆ RĘCZNIE.
ORIENTACYJNA GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA SIECI GAZOWEJ 0.8-1.20m
- ZAGŁĘBIENIE SIECI SPRAWDZIĆ NA ETAPIE BUDOWY PRZED
WYKONYWANIEM PRAC ZIEMNYCH POPRZECZ WYKOPY KONTROLNE
- PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELA GAZOWNI

OZNACZENIA	
	GRANICA DZIAŁKI ISTNIEJĄCEJ
	KRAWĘŻNIK ISTNIEJĄCY BEZ ZMIAN
	PROJ. NOWY KRAWĘŻNIK BET 15X30X100 WYNIESIONY +
	PROJ. NOWY KRAWĘŻNIK BET 15X22X100 WYNIESIONY + 20
	PROJ. NOWE OBRZEŻE BET. 8X30X100
	PALISADA BET. PROSTOKĄTNA 18x20 WYSOKOŚĆ
	OGRODZENIE ISTNIEJĄCE
	PROJ. WPŁYT DESZCZOWY
	PROJ. KANAŁ KD 315 SN8k/m2
	PROJ. PRZYPŁY KANAŁIK FI 200 SN8k/m2
	NOVA NAWIERZCHNIA ŚCIERALNA + WYRÓWNAWICZA Z BETONU ASFALTOWEGO
	CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ GRAFIT
	ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ GR.BCM "GRAFIT
	NOVA NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI BETONOWEJ GR.BCM - GRAFIT
	ZIELEŃ NISKA
	CHODNIK ISTNIEJĄCY Z KOSTKI BET. BEZ ZMIAN
	UMOCNIENIE SKARPY ECOKRATA Z TWORZYWA PP

ISTN. LINIA GAZOWA

KONIEC OPRACOWANIA
UL. SZKOLNA
ODCINEK KM 0+286.00
POŁĄCZENIE Z ISTN. NAWIERZCHNIĄ Z KOSTKI BETONOWEJ

WŁĄCZENIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ FI 315mm DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI POPRZECZ PRZEWIERT STEROWANY WSP W RURZE OSŁONOWEJ STALOWEJ Ø406mm BEZ MOŻLIWOŚCI ROZBIÓRKI JEJZNI L=13.0m / WŁĄCZENIE DO ISTN. STUDNI KD POPRZECZ NAWIERCENIE

<div><div>DROGOTOM ul. JESIONOWA 15 LOK. 8 45-409 Opole tel. 608 498 304 e-mail: drog@drogotom.pl www.drogotom.pl</div></div>		
NAZWA ZADANIA PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ		
TYTUŁ RYSUNKU MIEJSCOWOŚĆ LAMBINOWICE		
INWESTOR GMINA LAMBINOWICE		
LOKALIZACJA LAMBINOWICE		
NAZWISKO		PODPIS
PROJEKTANT branża drogowa		mgr inż. Tomasz Sokulski upr. bud. nr OPL/0243/PWOD/06
DATA	SKALA	
09/2023	1 : 500	NR RYSUNKU D/1
